REGIONE ABRUZZO

COMUNE DI SILVI

PROVINCIA DI TERAMO

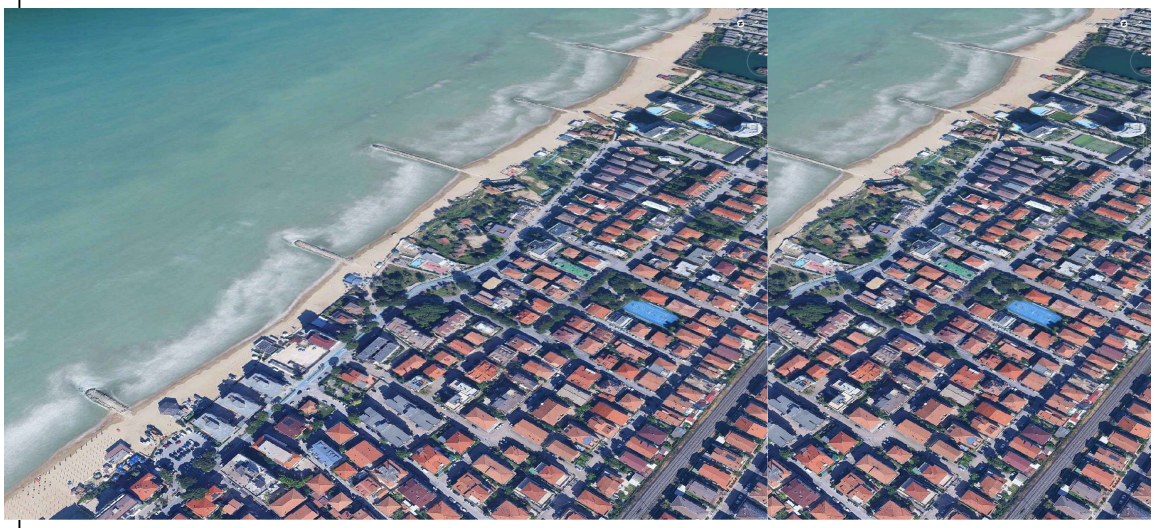

LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PENNELLI E BARRIERE SOMMERSE

(C.U.P.: H32B26003220002)

Progetto Esecutivo

Titolo elaborato :

CRONOPROGRAMMA

Committente:

COMUNE DI SILVI MARINA

AREA 2 TECNICA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E USIP

Responsabile Unico del Progetto:

Ing. Alessandra Ferrante

Progettista:

Ing. Daniela San Lorenzo

Daniela San Lorenzo
Ingegnere Idraulico
email: danielasanlor@gmail.com - pec: daniela.sanlorenzo@ingte.it
P.IVA: 01885620672

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
1423 SAN LORENZO dott. DANIELA
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE

Allegato:

R 11

Scala :

Formato foglio:

A4

Data :

Luglio 2026

Visto del Committente:

INDICE

1. PREMESSE ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

2. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI **3**

1. PREMESSE

Con determinazione n. 1429 del 28/05/2026 del Responsabile, l'Area 2 - Tecnica, del Comune di Silvi ha affidato all' Ing. Daniela San Lorenzo l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per i "Lavori di completamento di pennelli e barriere sommerse (CUP: H32B26003220002)".
In particolare, il Comune di Silvi è stato individuato dalla Regione Abruzzo quale soggetto attuatore dell'intervento denominato *Lavori di completamento di "pennelli e barriere sommerse"* di somma complessiva pari a 960'000,00 € con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 194 del 20/04/2026 "ART.2, L.R. 21/11/2019, N.39 recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LA GRAVE EROSIONE DELLA COSTA NELLA REGIONE ABRUZZO" - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ANNUALITÀ 2026". In data 24/04/2026 è stata sottoscritta la relativa convenzione.
L'intervento in progetto riguarda, nello specifico, il completamento del sistema di difesa costiera previsto dal Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica denominato "D.G.R. 181/21 – D.G.R. 795/22 del 20.12.2022 – Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico – annualità 2021-2022; Legge 30.12.2018 n. 145, art. 1, co. 134-135 – Realizzazione, manutenzione e rifioritura delle scogliere – CUP H37H22000280002" (di seguito PFTE), approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 06/12/2023.

Il presente rapporto riporta il cronoprogramma dei lavori previsti per l'esecuzione dell'intervento.

2. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASI DI LAVORO	TEMPI DI ESECUZIONE
	SETTIMANE: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13
	GIORNI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
INSTALLAZIONE DEL CANTIERE	
Installazioni delle recinzioni a terra	
Rilievo batimetrico ante-operam	
Installazioni delle delimitazioni a mare	
Installazione dei box di cantiere	
LAVORI DA TERRA	
Fornitura di materiali da cava terrestre	
Realizzazione del pennello nella parte emersa (pista di accesso senza coronamento per utilizzo come piana di carico per lavori da mare)	
Completamento del pennello parte sommersa e chiususa del coronamento parte emersa alla +1.50 m	
LAVORI DA MARE	
Completamento barriera sommersa	
SMOBILIZZO DEL CANTIERE	
Rimozione baraccamenti	
Rimozioni recinzioni	
Raccolta e smaltimento rifiuti/ pulizia finale	

In sostanza la durata delle attività di attuazione dell'intervento è stata stimata pari a 90 giorni naturali e consecutivi e comunque da realizzarsi al di fuori della stagione balneare.
